昱工業㈱　月間工程表　（　１　月　）

工　事　名
河メンテ　第５０１－００－０１－０２号
津島屋閘門排水機場　１号排水ポンプ更新工事

自：　R6　年　2　月　14　日
至：　R8　年　3　月　31　日
受注No.　71590235

＜店社＞
「安全衛生基本方針」
人間尊重の理念に基づき 安全を全てに優先させる
「年度安全目標」
事故・労働災害撲滅への不断の実行
「重点戦略」
過去の教訓を再認識し、安全意識の向上を図る

具体的施策
1．事故事例集を有効活用し、安全管理力の強化
2．徹底した危険要因の排除と確実な安全対策の実施
3．「事前訓練」と「検討会」による安全意識の改善
4．健康状態や年齢に配慮した快適な職場環境の構築
5．気持ちに余裕を持った安全運転の徹底

工事安全衛生方針
人間尊重の理念に基づき安全を全てに優先させる

作業所安全衛生目標
事故・労働災害撲滅への不断の実行

具　体　策
墜落・転落災害の防止

安全パトロール
M　安全衛生委員会Ｐ
N　安全品質環境部Ｐ
O　店社責任者Ｐ
P　安全衛生協力会Ｐ
Q　安全衛生協議会Ｐ
R　事業主Ｐ
S　元請Ｐ

安全施工サイクル（日常点検）

行事内容	時間
☑ 1．朝　礼	8 : 30
☑ 2．ＫＹＫ	8 : 45
☑ 3．パトロール	10:30/15:30
☑ 4．工事打合せ	13 : 00
☑ 5．後片付け	17 : 00
☑ 6．その他	

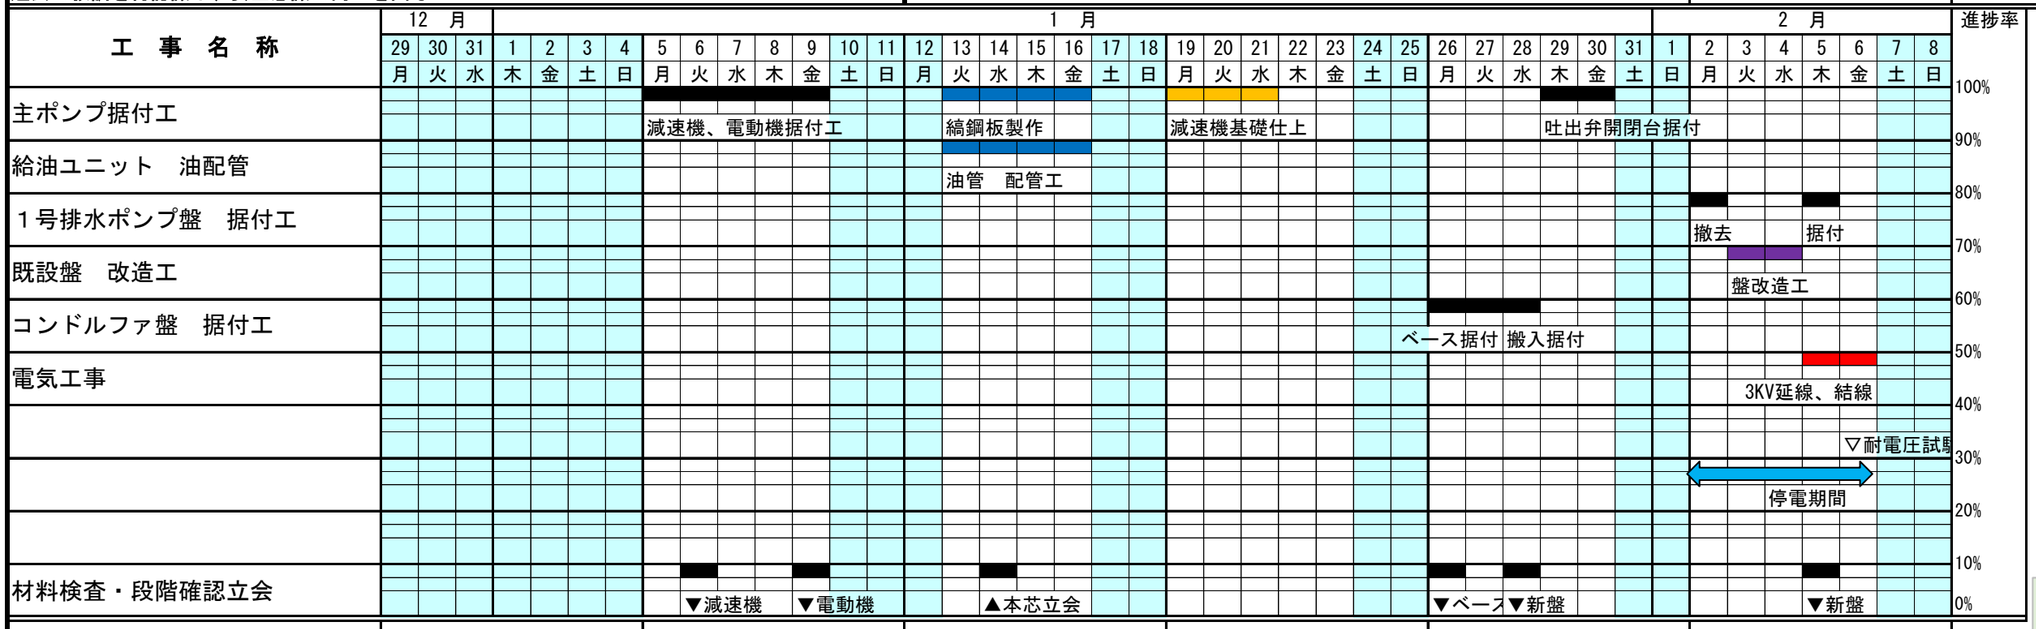

危険・有害作業
A　足場の組立解体作業
B　開口部・開口部付近・端部での作業
C　安全施設が十分確保できない場合
D　シャフト内での作業
E　高所作業車使用による作業
F　移動式クレーン等使用する作業
G　重量物及び重心が不安定な機器の搬入
H　車輌系建設機械を使用する作業
I　停電・活線・近接作業
J　酸素欠乏危険作業
K　火気使用作業
L　崩壊・倒壊危険作業

■ NXエンジ㈱
■ 機器回転
■ 土工（新水工業）
■ セルフレベリング（新潟ボンド）
■ 排泥工（新潟特殊）
■ 電気工事（真保電機）
■ 塗装工（山田塗装）
■ 盤改造工（三浦電機）
■ 直営（昱工業）

主要工事機器等		２５ｔラフター ４ｔユニック			２５ｔラフター ４ｔユニック	２５ｔラフター ４ｔユニック
危険・有害作業特定 （予想される危険・有害作業を記載）		B:開口部付近端部での作業 G：重量物及び重心が不安定な機器の搬入	B:開口部付近端部での作業 K:火気使用作業	B:開口部付近端部での作業	F：移動式ｸﾚｰﾝ作業 G：重量物及び重心が不安定な機器の搬入	F：移動式ｸﾚｰﾝ作業 G：重量物及び重心が不安定な機器の搬入
安全重点施策 （工程変更の場合に安全重点施策を変更し記録する）	計画	飛来・落下災害防止	飛来・落下災害防止	飛来・落下災害防止	飛来・落下災害防止	感電災害の防止
	変更					
防止具体策 （危険作業防止対策を記載）		F：地切･荷の安定･介錯ﾛｰﾌﾟ使用で飛来･落下災害防止 有資格者による作業 G：玉掛け、重心位置の確認	I、K：手順遵守による作業	I、K：手順遵守による作業	F：地切･荷の安定･介錯ﾛｰﾌﾟ使用で飛来･落下災害防止 有資格者による作業 G：玉掛け、重心位置の確認	F：地切･荷の安定･介錯ﾛｰﾌﾟ使用で飛来･落下災害防止 有資格者による作業 G：玉掛け、重心位置の確認
安全パトロール計画 （安全パトロールの内容を記載）		現場代理人Ｐ	現場代理人Ｐ	安全衛生委員会P	現場代理人Ｐ	現場代理人Ｐ
安全衛生に関する主な行事 （安全大会、安全教育、安全衛生協議会等）				安全パトロール	安全教育・災防協	

玉掛けワイヤー点検色

月	1月 5月 9月	2月 6月 10月	3月 7月 11月	4月 8月 12月
色	緑	黄	赤	白

作成者
中島
